

16/09/2025

SCRUM

de
Proyecto

¿Que es SCRUM?

Marco de trabajo, es un framework, para gestión

• Hacer Adaptar

¿por que adherir a todas las practicas ~~en~~ expresadas en
el (manifiesto ¿pi?) 1 conformado 4 valores y 12 principios

Propone cosas de como cumplir con ellos, lo materializa con
las practicas.

Adhere a la
practica
Empirica


Ayuda a ~~aporta~~ generar valor

↳ 3 pilas

↳ Adaptacion
↳ Inspeccion
↳ Transparencia

SCRUM Adhere
a las practicas

Roles = Categorías de Responsabilidades



Principio:
Tecnico y No Tecnico
Trabajando Junto

Con estas categorías, SCRUM
busca cumplir cumplir.

Por lo Product Owner y Scrum Master no pueden ser la misma persona

↓ Rol de Negocio → Rol Alto

↓ Pq hay q tomar decisiones estratégicas o presupuestas, etc.

1 Product owner
por un producto

(solo 1)

Scrum Master → Mediador entre Product Owner y Developers

↓ No coordinar el equipo
Pq son autogestionados

Lider de Servicio: Este para apoyar el equipo, organizar la ceremonia,
↓
Actitud colaborativa → apoyar lo en los recursos que necesita.

Eventos del Scrum
ceremonias

- Planning
- Daily
- Review
- Retrospective
- Refinamiento del Product backlog

↓ Agregar items, explicito

↓ Mantener organizado, actualizado, consistente

↓ Actividad On-Demand → Actividad Continua que vamos creando
según sea necesario.

Vision

↓ Objetivos

→ en disparador a la Configuración Inicial
(no necesariamente tiene un equipo).

Dueno del product backlog → el Product Owner

↓ ¿dice el Que?

• Si y D → Como?

Men 1 mes
Sprint: Es una iteración de
duración fija
↓
Contenedor
de todo lo que
hacemos.
↓
Que parece como
resultado en increment
de producto
Time
Box

↑
Todos los
eventos son

Cuántos items minimamente debe tener el product backlog por iniciar?

↳ las necesidades para poder ejecutar el sprint. Dependen de la capacidad del equipo y duración del sprint.

Planear (los requisitos del negocio).

Representado en el product owner

Generalmente no necesariamente con User Story

Tareas

Item del Product Backlog (requerimiento en el Backlog)

• US : entre 2 sprint

• epic : US Grande

Cualquier forma de producto

Cualquier forma de describir requerimientos / características que el producto no debe tener.

! No son tasks

esto es el sprint backlog

Todos esto puede estar en el Product backlog.

• Tarea : Agrupado

• Spikes

• Tech Story : Refactorización

Requerimientos No funcionales

No se estora
pg no se implementa por si mismo

Ver en función de una funcionalidad

No es lo mismo que defecto

Con defecto el software No funciona

• Deuda Técnica : lo hacemos así no más para seguir

Por incluir a el sprint backlog

los US debe pasar el "Definition of Ready" (que el equipo definió)

! Durante el sprint No hay cambios

Los cambios son por los sprint

• El producto Owner puede cancelar un sprint

• Se puede cambiar la duración del sprint (pero normalmente se ejecuta uno).

Defectos : No es la configuración inicial
pg no hay software, pero luego de iteración puede estar.

Comple con el INVEST
↓
parte del DOR

Y está dentro del Sprint

Antes del ^{Ceremonia} Sprint planning pueden hacer cualquier cambio.

todos los
elementos debe
estar presente
en el planning

Definir el incremento de producto y el objetivo para lo que hay que hacer en ese sprint (y es ~~el~~ el incremento)

Del resultado deben salir el Sprint backlog.

Puede que el PO no esté en el comité? ¿se hizo la estimación

pero ¿es el que?

Poker planning

Fibonacci

No hace falta
descomponer la
User Story en tareas

Cada uno
se compromete

US → se estiman en Story point


Tareas → se estiman en esfuerzos → horas ideales

Tablero de Scrum

Para equipos maduros, capaces, motivados, etc.

Y Multidisciplinario

, experiencia, formación

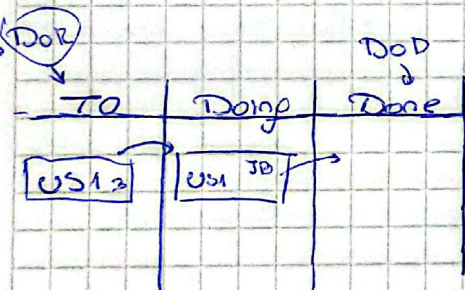

Criterio p indicar que la US
está por presentar Definición
of Done, si no la cumple
no la puedo presentar

Lo p el equipo
quiere por decir
"Termine esta US"

• Las ideas se hacen cargo de la tarea (método pull), nadie se la impone

• Cuando cumple con el Definition of Done pasa de Doing a Done

• En la segunda parte del planning se define el cómo abordar la user y
se parte de ello sacar las tareas.

en Scrum es un Gestor Product, o está terminada la US y se puede

Presentar en el Review o No

creándose

Daily Standup Meeting

- ↳ Que hiciste → Desde la Daily Anterior
- ↳ Que Pienso
- ↳ Que impedimentos → si/no

! Todos los desarrolladores deben estar en la Daily y el SM también.

↓
Es obligatorio que todos lo que hacen trabajo reporten.

Por que? Utilización

- ↳ Sincroniza el equipo y sabe a que le falta los días
- ↳ Muestran en que se actualiza el trabajo

El PO decide y si es producción o no

Resultado de

- ↳ Tenemos producto que ya puede ir a producción
- ↳ entre

Review

- ↳ Inspecciona y acepta el producto (empirismo)
- ↳ Aceptamos el proceso

ultimo día Retrospective

Si presento lo que cumple con el DOD, pero no lo acepta el PO, este me devuelve el producto lo cual lo coloca por el PO. Esto me define

Velocidad ← Medida de SCRUM.

- ↳ Mide software funcionando → cantidad de ~~para~~ puntos de historia de las US que en la Review el PO acepta
- ↳ Solo cuenta las que acepta el PO.

Resumen

Las categorías

Ceremonias

Artefactos

Product backlog

Sprint backlog

Increment

Formalización de los Artefactos

- Definir el objeto de producto

- Definir el **DOD** cuando vas considerando que el incremento está listo

Lo hace el equipo
(está el PO)
es parte

SCRUM plantea el alcance de una iteración (explicar eso)

Nivel de
Planificación

Puede ser en release (puede ser en MVP) son muchas iteraciones.
únicamente

Planificación por folio → cuando tenemos muchos productos → es la prioridad

