


Componentes de un proyecto de SW

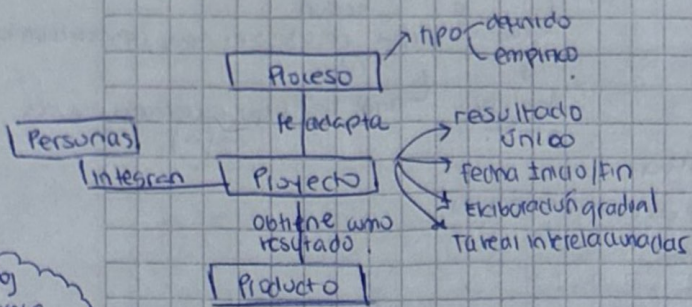

codigo → líneas que escribo.
Software → TODO incluyendo el código

Planificación de un Proyecto de SW

Unidad de gestión de trabajo.

Pasos:

1. Definir el objetivo del proyecto. ¿Qué?

- Claro
- Alcanzable

2. Definir el alcance del proyecto.

• todo y solo el trabajo q el cliente realizar para cumplir el obj. del proyecto.

Ej: un proyecto puede ser definir requerimientos

- alcance: definir req, validar el cliente. vs.

ERS: es distinto al del proyecto.

3. Definir el proceso y el ciclo de vida → ¿cómo?

proceso definido → adapto al proyecto, lo hago te justifica

↳ no hay restricción con el ciclo de vida

proceso empirico → lo adapto

↳ solo ciclo de vida, iterativo.

4. Definir el equipo de proyecto → ¿quién? asume cada rol.

rol → lider. (puede o no ser el jefe) → puede ser un lider q impone o q

convita

desarrollador
diseñador
analista

→ lo extraigo del proceso (responsabilidad)

1 persona → roles

5. Estimación → suponemos (el una predicción) puede o no suceder

SIEMPRE tiene asociado un factor de probabilidad.

tradicional

• 1. Tamaño → producto → W (estimar tamaño) $\times$ complejidad.

• 2. Esfuerzo (horas personas lineales) → proyecto.

• 3. Tiempo (calendario) → proyecto.

• 4. Costos

• 5. Recursos críticos (elemento q necesito en cierta cantidad q no puedo tener)

(puede no tener pero si tiene hay q estimar).


determinación del costo, los

⊕ para el
esfuerzo de la
gente.

→ Aprender a bajar el tpo y no bajar los costos.

para el final → juicio experto.

Triángulo de Hierro | Triple Restricción



→ Debemos al menos poder controlar 2

Alcance → del lado del cliente.


↳ de este se derivan el tpo y los recursos.

→ Tradicional: se aceptan los cambios de los req. pero cuesta la negociación

x q al inicio del proyecto los deja más fustigando demandas.

NOTA

El agilismo parece voltear el triángulo:



iteración

Iterativo, incremental de alcance MJO. → PUD
La iteración no termina hasta que termine todos los W con los que me comprometí.

Duración MJO → SCRUM
↓
Agilismo (Time box (tpo excedido en una caja))

- Estoy fijando el tpo
- Sobre el backlog el cliente puede hacer cambios
↳ pero dentro de una iteración no se aceptan cambios.

6. Calendarización - Programación del proyecto.

(Se anticipa toda la tarea de principio a fin que se va a hacer.

Asignación anticipada, ≠ asignación diferida

↳ No está definido

7. Riesgos

8. Seguimiento y control.

9. Retiros.

(Proceso decalado → visibilidad objetiva para poder hacer seguimiento)

Agilismo → Lo importante es el proceso

tradicional → (+) orientado al producto.
